汚水処理整備区域図　　アクションプラン

■目標年次	令和8年度

■手法毎の汚水処理整備区域

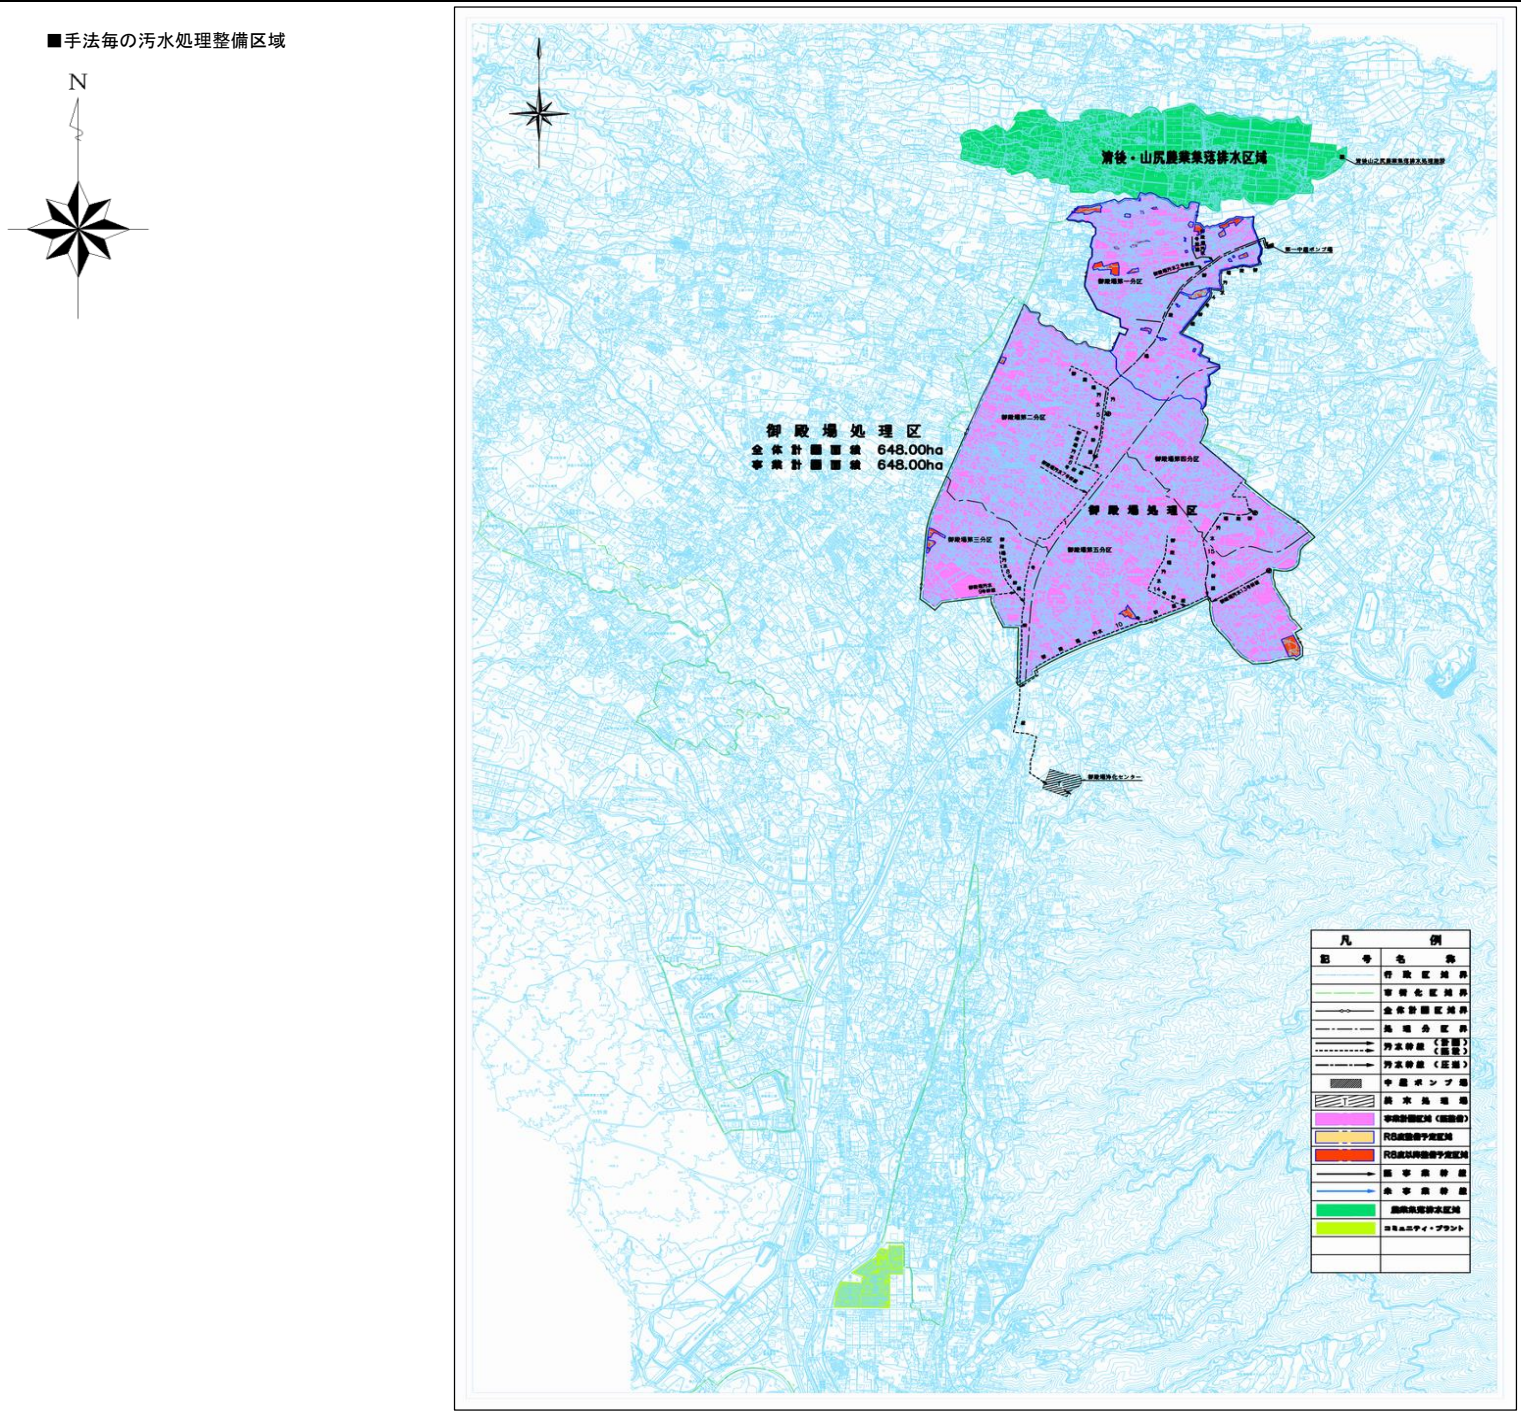

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
	農集排											
	コミュニティプラント											
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
		公設浄化槽整備事業										
実行メニュー	共通	広報誌等による啓発活動										
	浄化槽	合併処理浄化槽への転換に対する補助事業										

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	農集排	浄化槽		コミプラ	早期概成手法	備考
					個人	市町村			
整備手法	整備人口（人） 期間内	3,332	−627	−137	3,716	537	−157		
	整備人口（人） 累計	59,445	30,842	1,093	25,226	1,027	1,257		
	整備面積（集合処理分）(ha) 期間内	29.4	29.4	0.0			0.0		
	整備面積（集合処理分）(ha) 累計	682.1	636.0	29.6			16.5		
目標値	汚水処理人口普及率(%)	71.8	37.2	1.3	30.5	1.2	1.5		
計画水量（m3/日）		16,964	15,788	547			629		
計画汚泥量（t/日）		7.7	6.6	0.2	0.6	0.0	0.3		合併処理浄化槽は1.2L/人・日で算定、含水率98%で想定
概算事業費	総建設事業費(百万円)	49,064	36,310	1,593	10,227	416	518		浄化槽は1基建設費90万円、1基維持管理費5.88万円/年で世帯数に乗じて算出
	年間維持管理費（百万円/年）	1,078	329	28	668	27	26		
整備人口一人当たりの建設費用（千円/人）		825	1,177	1,457	405	405	412		
実行メニュー	広報誌等による啓発活動		○		○	○			
	合併処理浄化槽への転換に対する補助事業				○	○			
